

VRSTA IZVEDBENE
DOKUMENTACIJE:

ELABORAT DELNE ZAPORE CESTE

ŠT. ELABORATA:

10-V-2025-BM

PROJEKT:

SANACIJA PREPUSTOV VIZORE, HOMEČ, LANDEK

OPIS GRADNJE:

Novogradnja

NAROČNIK:

**Občina Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik**

Kraj in datum:

Velenje, oktober 2025

IZVAJALEC:

**RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska 6, 3320 Velenje**

Izdelal:

Blaž Mošmondor

Vodja del:

Blaž Mošmondor

VSEBINA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA

1	SPLOŠNO.....	2
2	TEHNIČNO POROČILO	3
3	ZAČASNA PROMETNA UREDITEV	4
4	PREGLEDNA SITUACIJA ZAČASNE PROMETNE UREDITVE	5


KAZALO SLIK IN TABEL

Slika 1: Ureditev prepust Vizore	5
Slika 2: Ureditev prepust Homec	6
Slika 3: Ureditev prepust Landek.....	7

Tabela 1: Predvidena prometna signalizacija	4
---	---

1 SPLOŠNO

V sklopu sanacij prepustov na javni poti JP 964991 (Vizore–Landek–Vine–Homec) se predvideva celovita zamenjava poškodovanih in poddimenzioniranih premostitvenih objektov, ki so bili poškodovani v poplavah leta 2023. Obstoječi prepusti bodo odstranjeni in nadomeščeni z novimi armiranobetonskimi konstrukcijami ustreznih dimenzij, ki bodo zagotavljale varno prevajanje visokovodnih pretokov neimenovanih vodotokov. Na vseh lokacijah se izvedejo tudi kamnito-betonska zavarovanja vtoka in iztoka, stabilizacijski talni pragovi ter ureditev gorvodnih in dolvodnih brežin za preprečitev erozije. Cestne površine bodo obnovljene z novimi voziščnimi plastmi in ustrezno prometno signalizacijo, omogočeno bo odvodnjavanje padavinskih voda. Dela vključujejo izvedbo obvozov, izkope, temeljenje, betonska in asfalterna dela ter ureditev okolice.

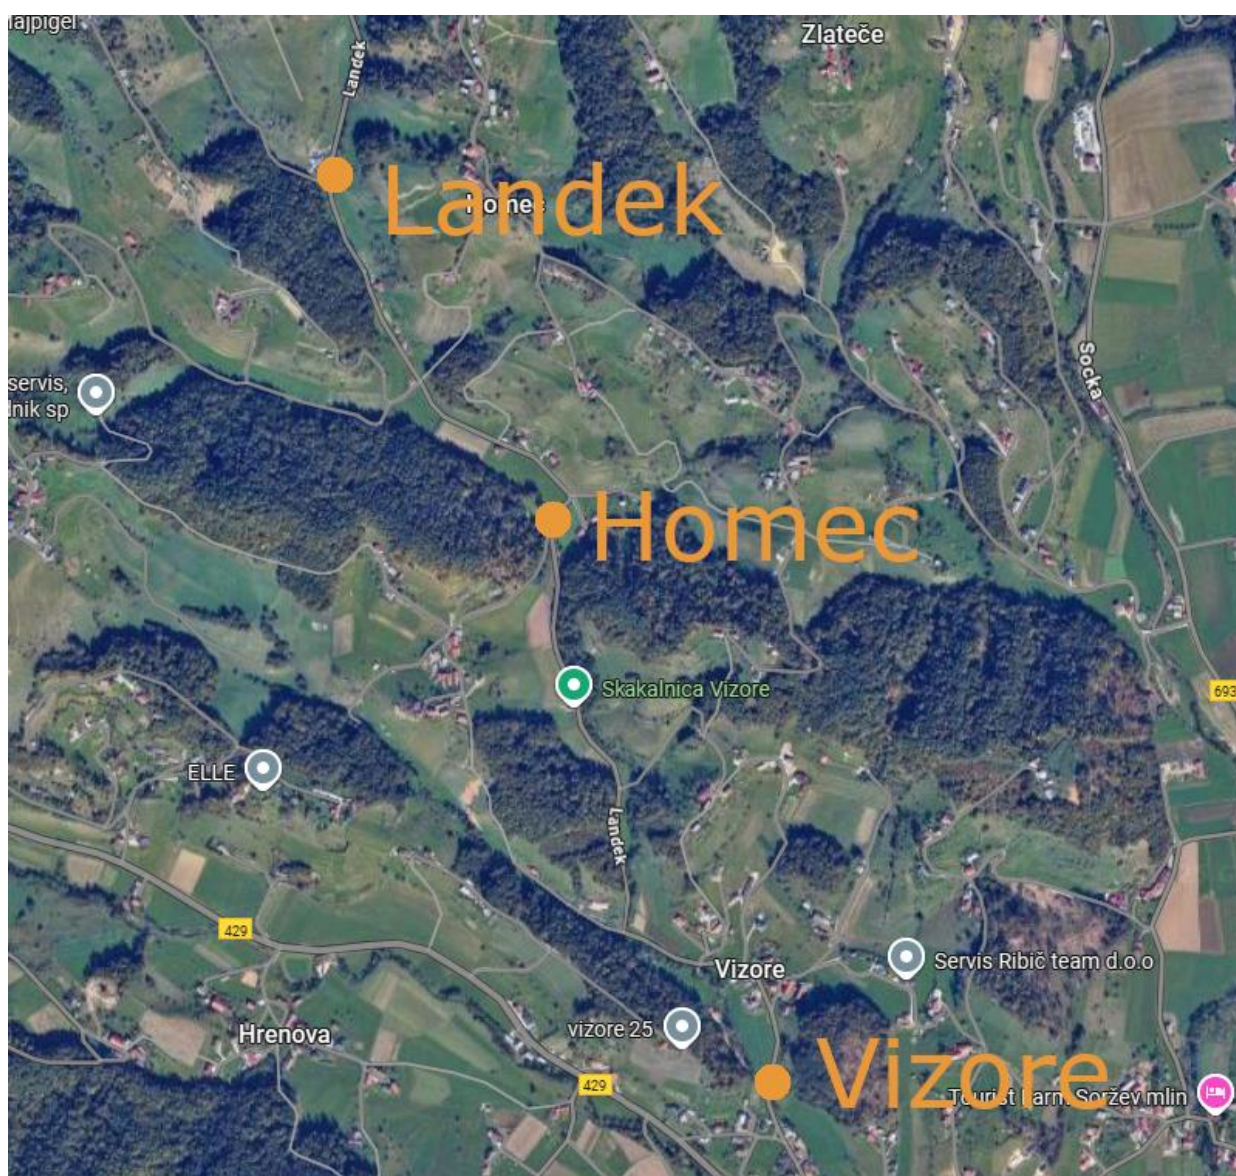

Slika 1: Lokacija prepustov

2 TEHNIČNO POROČILO

Izvedla se bo sanacija prepustov Vizore, Homec in Landek, ki je na JP 964991 in premošča neimenovan pritok Dobrnice. Zamenjala se bo vsa mostna konstrukcija, izvedla VGU in obnova vozišča tako, kot JVO in prometnih znakov.

V času gradnje je zato potrebno izvesti delno zaporo vozišča z izmeničnim enosmernim prometom v območju prepustov na JP 964991 za vsa vozila. Gre za javno pot, ki je najbolj prometno obremenjena v jutranji in popoldanski konici. V času delne zapore bo stalno omogočen prevoz za intervencijska vozila.

V času zapore se doda vertikalna prometna signalizacija, obstoječe prometne signalizacije ni, zato je ni potrebno prekriti.

Delna zapore bo predvidoma trajala od 27. 10. 2025 do 31.12.2025.

Predvidena delovna hitrost je 30 km/h v območju gradbišč, tip vozišča pa tamponsko nasutje in širina pasu 2,50m – 3,00m.

Za vsako lokacijo se dela izvajajo ločeno, z enakim režimom zapore:

- Faza 1 – priprava in zaščita: izvedba začasnega obvoza, označitev zapore, postavitve signalizacije, ureditev obvoznih mest/umika
- Faza 2 – zemeljska, rušitvena in vodnogospodarska dela: rušitev obstoječih prepustov in odvoz, izkop v strugi, priprava tamponske plasti, vgradnja AB cevi prepusta, izvedba ustnikov in tesnitev
- Faza 3 – zasip in stabilizacija: slojevito zasipavanje, zbijanje, zaščita brežin s kamnito betonsko oblogo, preusmeritev toka
- Faza 4 – vozišče in zaključek: tampon, asfaltni popravki, povrnitev bankin in odvodnjavanja
- Faza 5 – odstranitev začasnega obvoza in prometne signalizacije ter sprostitev prometa

RGP d.o.o. postavi začasno prometno signalizacijo skladno s tem elaboratom in veljavno zakonodajo. Dnevni nadzor in vodenje dnevnika zapore (stanje znakov, čistoča vozišča, poškodbe).

Pred začetkom del: obvestilo krajanom (oglasna deska/splet občine) z navedbo terminov in kontaktov.

3 ZAČASNA PROMETNA UREDITEV

Elaborat predvideva delno zaporo cestišča na območju prepustov. Obvoz je urejen in označen, na način, da udeležencem v prometu zagotovi pravočasne in pregledne informacije o poteku obvoza. Zaradi relativno majhnega PLDP-ja ni pričakovati zastojev na poteh, kjer bo potekal obvoz.

Obvoz bo potekal preko nasipov gorvodno od prepustov, ki bo urejen z AB cevjo DN1200 in utrjenim nasipom po slojih 30 cm, promet bo potekal enosmerno – glede na prednost vozila po prometni ureditvi.

Popis potrebne začasne prometne signalizacije zapore:




znak			kom
	2202	Prepovedan promet v obeh smereh	3
	7101	Čelna zapora	3
	7101-1	Čelna zapora	3
	7201	Oranžna luč na tabli čelne zapore	3
	3309	Smer obvoza	7
	3309-1	Smer obvoza	7
	1125	Delo na cesti	2

Tabela 1: Predvidena prometna signalizacija


4 PREGLEDNA SITUACIJA ZAČASNE PROMETNE UREDITVE

Prepust Vizore:

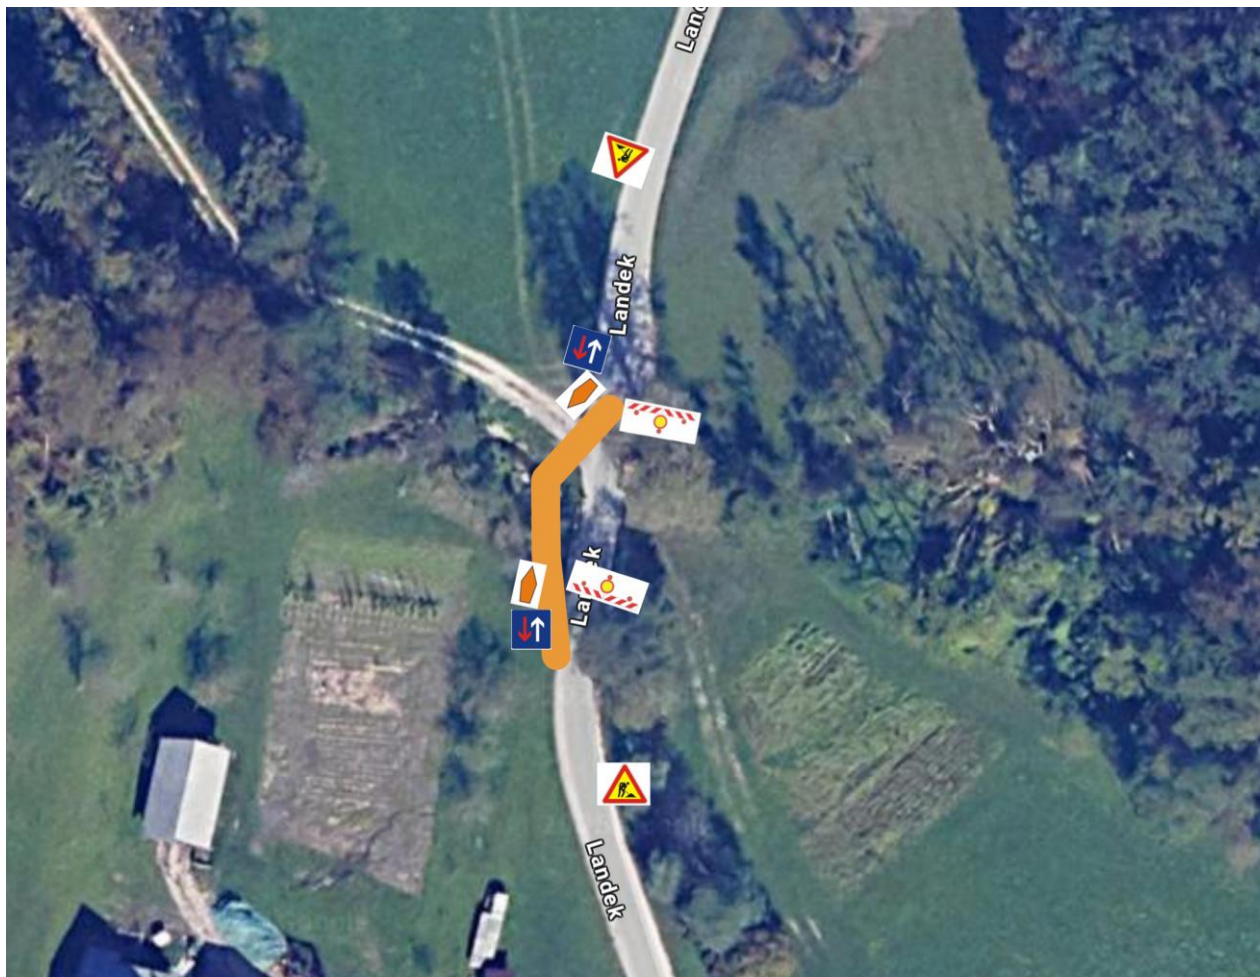

Slika 1: Ureditev prepust Vizore

Prepust Homec:

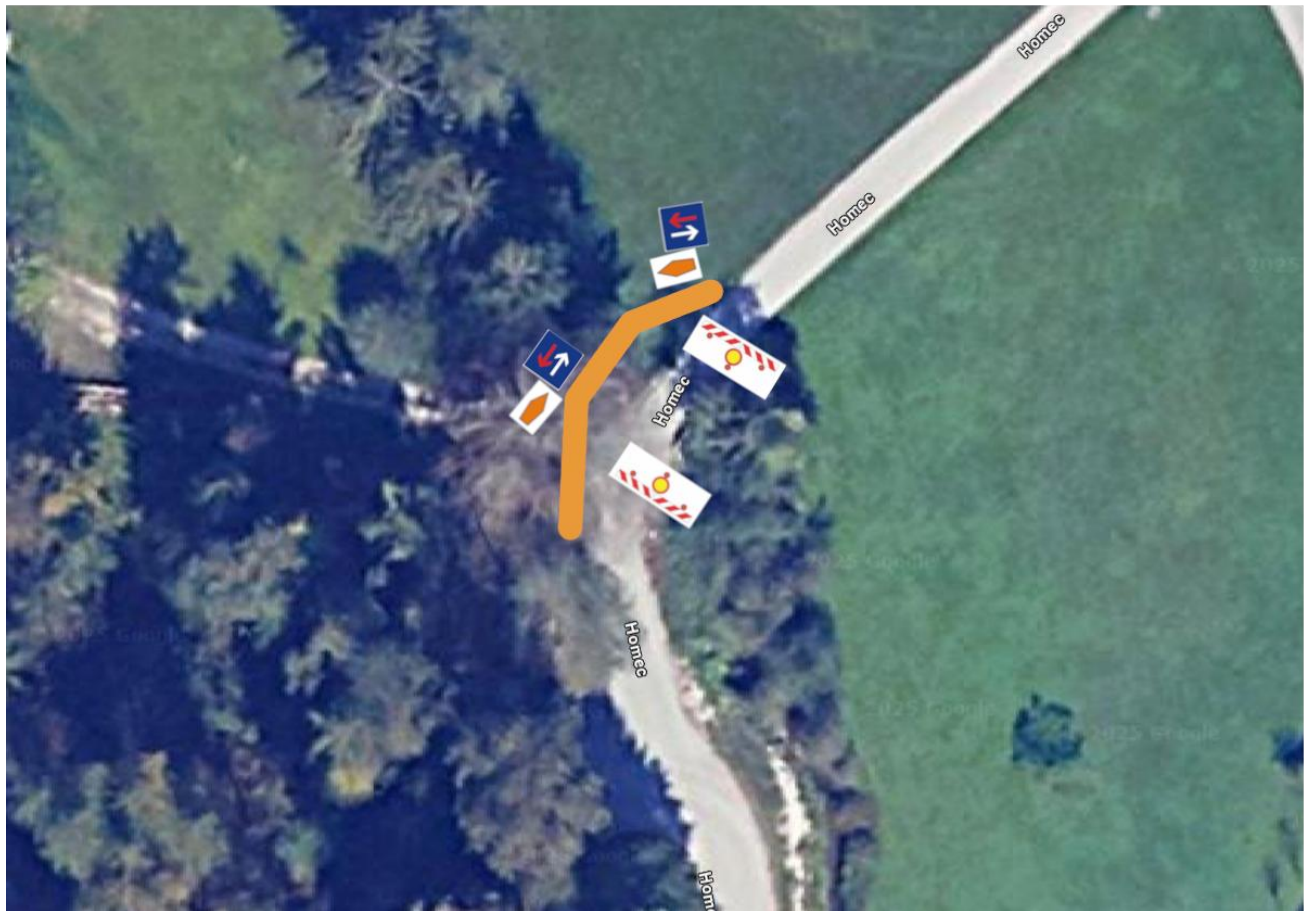

Slika 2: Ureditev prepust Homec

Prepust Landek:



Slika 3: Ureditev prepust Landek
