IES-01 Popis prefabriciranih fasadnih stebrov 1F

FAZE IZGRADNJE	Etaža	Oznaka	Tloris	KOS	VIŠINA	VOLUMEN
1. FAZA						
	Pritličje	AB-PFS00		7	3,71	4,50
	Pritličje	AB-PFS10D		2	3,71	1,28
	Pritličje	AB-PFS10L		1	3,71	0,65
	Pritličje	AB-PFS15D		2	3,71	1,30
	Pritličje	AB-PFS15L		1	3,71	0,65
	Pritličje	AB-PFS20L		4	3,71	2,56
	Pritličje	AB-PFS30D		2	3,71	1,28
	Pritličje	AB-PFS30L		1	3,71	0,65
	1. Nadstropje	AB-PFS00		7	3,93	4,79
	1. Nadstropje	AB-PFS10D		1	3,93	0,67
	1. Nadstropje	AB-PFS10L		3	3,93	2,05
	1. Nadstropje	AB-PFS15D		2	3,93	1,38
	1. Nadstropje	AB-PFS20D		1	3,93	0,67
	1. Nadstropje	AB-PFS20L		1	3,93	0,69
	1. Nadstropje	AB-PFS30D		2	3,93	1,36
	1. Nadstropje	AB-PFS30L		2	3,93	1,36
	1. Nadstropje	AB-PFS40D		1	3,93	0,69
				40		26,53 m³

IES-01 Popis prefabriciranih fasadnih nosilcev 1F

FAZE IZGRADNJE	Etaža	Oznaka	2D PREREZ	KOS	DOLŽINA (m')	VIŠINA (m')	VOLUMEN (m3)
1. FAZA							
	Pritličje	AB-PFNP		1	6,74	0,19	0,76
	Pritličje	AB-PFNT		1	3,15	0,90	2,12
	Pritličje	AB-PFNT		1	6,30	0,90	4,24
	Pritličje	AB-PFNT		1	6,30	0,90	4,24
	Pritličje	AB-PFNT		1	6,30	0,90	4,24
	Pritličje	AB-PFNT		1	6,30	0,90	4,24
	Pritličje	AB-PFNT		1	6,53	0,90	4,39
	Pritličje	AB-PFNT		1	8,40	0,90	5,65
	Pritličje	AB-PFNT		3	8,40	0,90	16,95
	Pritličje	AB-PFNT		4	2,10	0,90	0,00
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	3,15	0,30	0,63
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	6,30	0,30	1,26
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	6,30	0,30	1,26
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	6,61	0,30	1,32
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	8,40	0,30	1,68
	1. Nadstropje	AB-PFN		1	8,45	0,30	1,69
	1. Nadstropje	AB-PFN		2	6,30	0,30	2,52
	1. Nadstropje	AB-PFN		2	8,40	0,30	3,36
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	0,00	0,30	0,00
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	3,15	0,30	0,63
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	6,30	0,30	1,26
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	6,30	0,30	1,26
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	6,30	0,30	1,26
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	8,40	0,30	1,68
	2. Nadstropje	AB-PFN		1	8,45	0,30	1,69
	2. Nadstropje	AB-PFN		2	6,30	0,30	2,52
	2. Nadstropje	AB-PFN		2	8,40	0,30	3,36
							74,21 m³

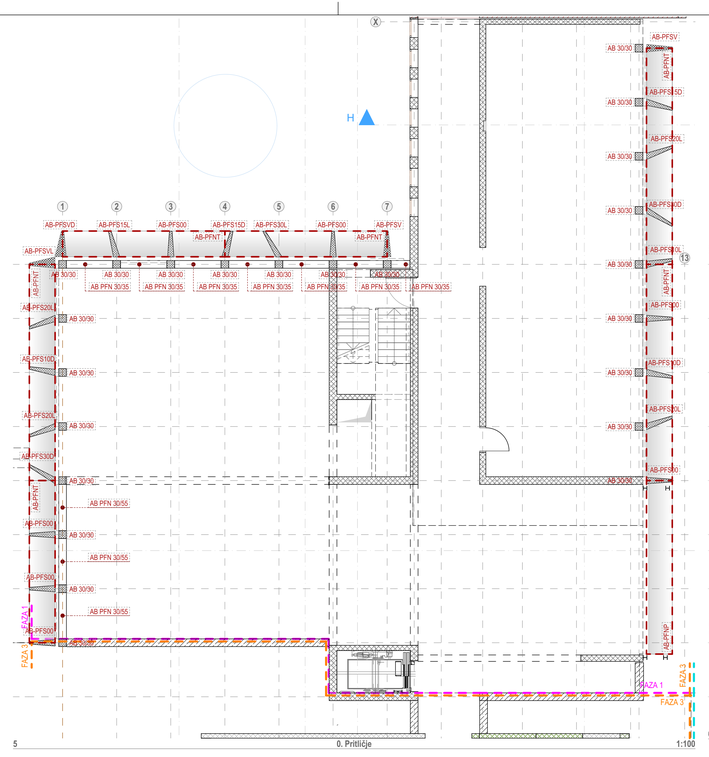

5 0. Pritličje 1:100

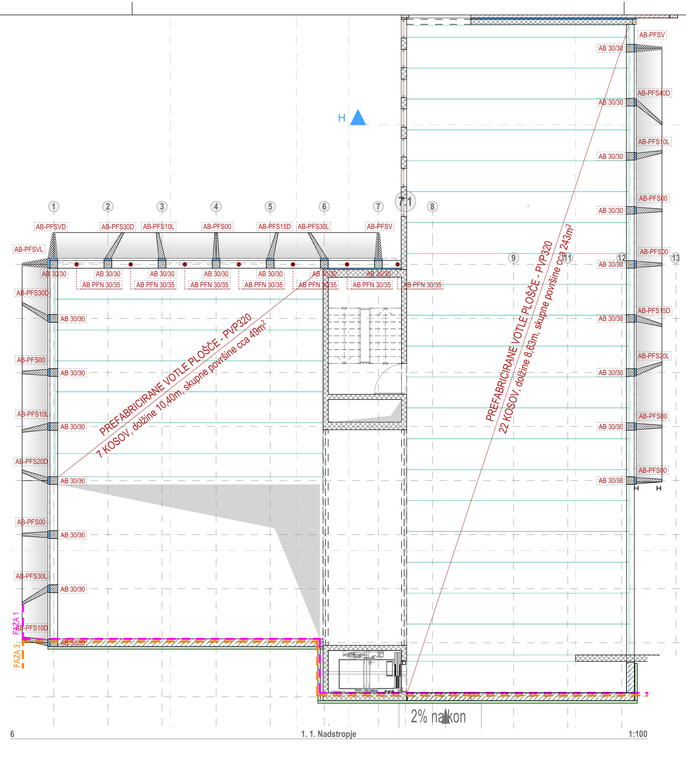

6 1. 1. Nadstropje 1:100

IES-01 Popis prefabriciranih fasadnih stebrov VOGALNI 1F

FAZE IZGRADNJE	Etaža	2D POGLED	Oznaka	KOS	VIŠINA	VOLUMEN
1. FAZA						
	Pritličje		AB-PFSV	2	8,10	3,18
	Pritličje		AB-PFSVD	1	8,10	1,93
	Pritličje		AB-PFSVL	1	8,10	1,93
						7,04 m³

2 IES-01 Popis prefabriciranih fasadnih stebrov VOGALNI 1F 1:1



4 FASADNI PREFABRICIRANI ELEMENTI POGLED 1:25

OPOMBA: IZDELAVA IN MONTAŽA PO POTRDITVI OVP PREDHODNO IZDELANIH DELAVNIŠKIH NAČRTOV DOBAVITELJA!

SPREMEMBE

STYRIA ARHITEKTURA

T: +386 (0)2 228 29 66
F: +386 (0)2 228 29 69
E: INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
GAMARJEVA ULICA 42, SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

Občina Miren-Kostanjevica

±0,00 = +47,98

objekt: **OŠ Miren in postavitev nove telovadnice**
OSNOVNA ŠOLA MIREN, Miren 140
k.o. 2320 - MIREN (del. st. 6223, 6227, 6228, 6231, 6231/0, 6234, 6235, 6238, 6242, 6244, 6261, 6691/0, 6694, 6697, 6699, 976, 977/3, 977/4, 978

lokacija: **Občina Miren-Kostanjevica**
Miren 137, Miren - Slovenija

naročnik:

vrsta načrta: **SPD**

projekt: **PZI - Projekt za izvedbo**

načrt: **PREFABRICIRANI FASADNI ELEMENTI 1FAZA**

datum: SEPTEMBER 2018

štev. projekta: **01/18**

odgovorni vodja projekta: David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

odgovorni projektant: David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

projektant: Jerne METEZ, dipl.ing.grad.;
CA-Miren PZI - Izdelava - 29. 04. 2019

projekt ID:

merilo: 1:1, 1:1,01, 1:25, 1:100 list št.: **2.1**
